

# 마천역 엘리베이터 설치 등 장애인, 노약자 교통불편 해소

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황	
비예산	임기내	지속	서울교통공사	정상추진

## 1. 사업목표

- 임기내 목표: 마천역 지상구간 엘리베이터 설치
- 연차별 추진계획

연 도	구 분	목 표	비 고
2020년		설계안 최종 확정	
2021년		착 공	공사기간 평균 2년
2022년		완 공	

## 2. 사업개요

- 기 간: 2018~2022년
- 위 치: 지하철 5호선 마천역 1번출구 옆(마천초교 부지내)
- 규 모: 엘리베이터 24인승
- 주요내용: 지상구간에서 엘리베이터 설치
- 소요예산: 2,500백만원 (시비)

## 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'19. 4분기	10~12월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진방법 확정- 마천역 1번 출구 계단을 철거하고 계단 위치에 '경사형 엘리베이터' 설치</li> <li>○ 설계용역 발주준비- 설계서 작성, 기술용역티당성 심사 등 용역 진행에 필요한 절차진행</li> </ul>	

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 엘리베이터 설치위치 선정에 장시간이 소요되었으나, 1번출구 계단을 철거하고 본 위치에 '경사형 엘리베이터'를 설치하기로 결정하여 문제해결 됨

#### 5. 주민소통 실적


구 분	일 자	주 요 내 용
설명회·토론회	2019.11.20.	◦ 구의회 업무보고

#### 6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2020년 1 분기	◦ 「기본 및 실시설계」 용역발주 (용역기간: 2020. 01~12.)
2020년 2 분기	◦ 「기본 및 실시설계」 용역시행

#### 7. 집행예산 현황 - 비예산

#### 8. 위치도

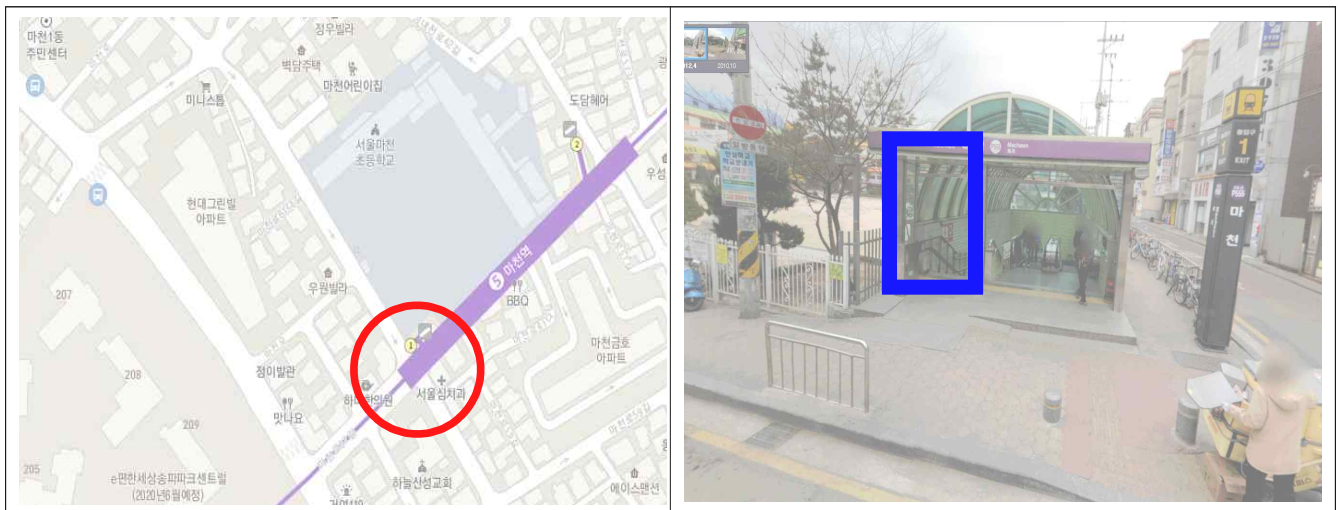

교통과	과장 허한양	교통운영팀장 최낙연	담당 박상희 (☎ 3135)
-----	--------	------------	-----------------
