

위례파출소 신설

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황
비에산	임기내	지속	서울지방경찰청 정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 위례파출소 신설 및 정상운영
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
위례파출소 신설	· 사업예산 확보	· 공사 착공	· 공사 준공 및 위례파출소 정상운영		

2. 사업개요

- 기 간 : 2017. 2. ~ 2020. 7.
- 주요내용
 - 위례파출소 준공
 - 위치 및 규모 : 장지동 889, 대지면적 660㎡(지상 3층)
 - 기 간 : 2017. 2. ~ 2020. 6.
 - 사업비 : 3,160백만원 (서울지방경찰청 예산)
 - 위례파출소 운영
 - 운영시기: 2020. 7. ~
 - 관할현황: 인구 42,241명(경찰1인당 담당1,408명), 면적 2.55km²
 - 근무인원: 30명(파출소장1, 관리요원1, 순찰팀원28, 순찰차 2대)
 - 내 용: 문정지구대, 거여파출소 관할구역 중 위례동을 분리하여 전담
 - 현 상 황: 한시적 치안대책으로 「위례초소」 운영 중

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 3분기	8월	◦ 위례파출소 시설확충을 위한 설계변경 실시	
'18. 4분기	12월	◦ 위례파출소 설계변경용역 완료	
'19. 1분기	3월	◦ 위례파출소 설계변경에 따른 추가예산 확보	
'19. 2분기	5월	◦ 위례파출소 공사업체 선정되어 착공 준비 중	
'19. 3분기	9월	◦ 위례파출소 공사 착공	
'19. 4분기	12월	◦ 위례파출소 공사 진행 중	

4. 문제점 및 대책(현안사항)


- 위례파출소 공사 착공이 9월에 시작되어 동절기에는 날씨관계로 공사 진행이 어렵기 때문에 준공 시기는 2020년 상반기 중으로 예상됨

6. 향후 추진계획

기간		추진내용
2020년	1분기	◦ 위례파출소 공사 진행
	2분기	◦ 위례파출소 공사 준공 예정
	3분기	◦ 위례파출소 개청

7. 집행예산 현황 : 비예산

8. 위치도 및 현황사진

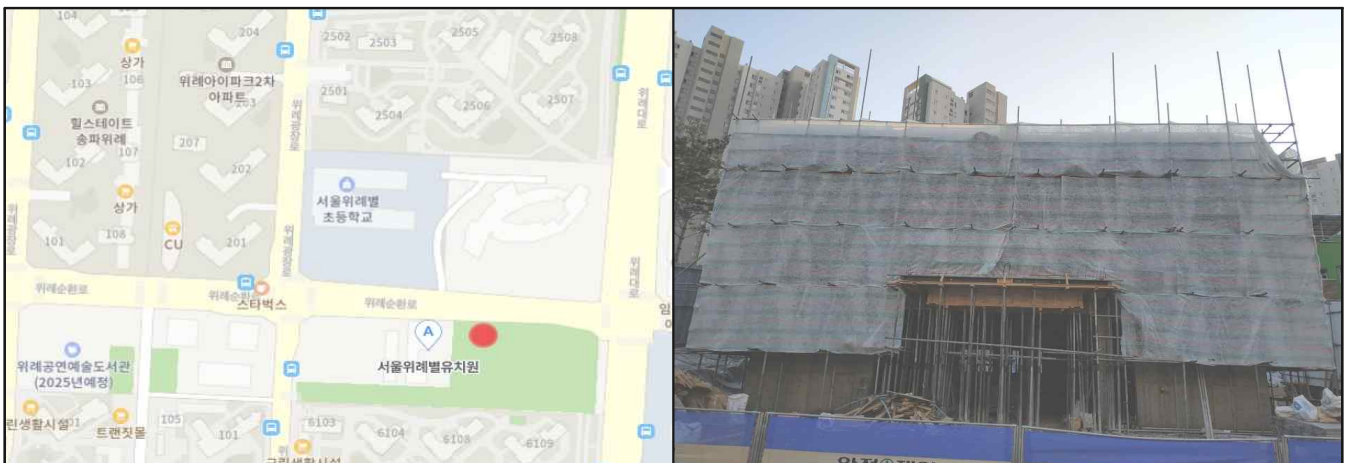

재난안전과	과장 엄대섭	안전기획팀장 장성순	담당 서재호 (☎ 3096)
-------	--------	------------	-----------------
