

로데오거리 걷기편한 거리조성사업

소요예산	사업구분	사업주체	추진상황	
1,500백만원	임기내	지속	도로과	완료

1. 사업목표

- 걷기편한 거리 조성
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
로데오거리 걷기편한 거리조성사업	· 공사 발주 및 시행	· 조성 완료			

2. 사업개요

- 기 간 : 2018. 3. ~ 2019. 4.
- 주요내용
 - 보행환경 개선
 - 위 치 : 문정동 로데오거리(동남로 92 ~138)
 - 내 용 : 보도정비 37a, 하수관 개량 D=300mm, L = 1,012m, 보차도경계석 및 측구 정비 1,012m, 가로등 정비 40본
 - 사업비 : 1,500백만원(市특별교부금)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 3분기	2018. 7.12.	◦ 주민설명회 개최	1,011
	2018. 8.29.	◦ 용역 준공	
	2018. 9. 3.	◦ 공사 계약 및 착공	
'18. 4분기	2018.11.30.	◦ 보도포장, 하수관개량, 가로등 정비 등 주요 공종 완료	489
	2018.12.	◦ 사고이월	
'19. 1분기	2019. 1.15.	◦ 구청장 현장 방문	489
	2019. 1. ~ 2	◦ 상가조합 요구사항에 대한 의견 조율 및 협의 완료	
	2019. 2 ~ 3	◦ 배너길이 설치 40개, 상수도관 이설 및 하수관 정비 25m, 보도 숫자입력 등 잔여공종 시행	
'19. 2분기	2019. 4. 30.	◦ 공사 준공 (완료)	

5. 주민소통 실적


구 분	일 자	주 요 내 용
상점가 조합과 소통	2018.3.~ 2019.4.	◦ 상점가 조합과의 지속적인 소통을 통한 의견 수렴 및 조율
설명회·토론회	2018.7.12	◦ 주민설명회 개최
구청장 현장방문	2019.1.15	◦ 구청장 현장방문하여 사업 추진현황 파악 및 주민(상점가 조합 및 해당동 주민) 의견 청취

7. 집행예산 현황

(4/4분기 기준, 천원)

구 분	금 액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		489,705	489,676	29	
국 비					
시 비		489,705	489,676	29	
구 비					

8. 현황사진

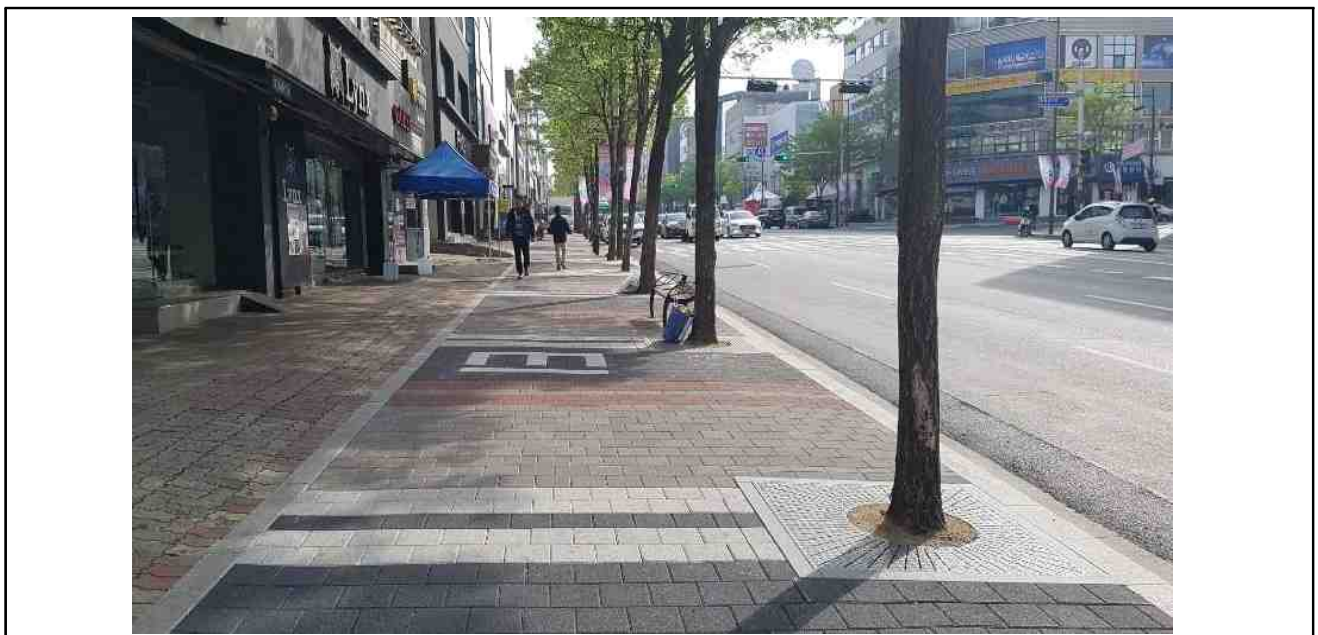

도로과	과장 장형상	보도관리팀장 김용남	담당 강향길 (☎ 3309)
-----	--------	------------	-----------------
